



DOSSIER DE PILOTAGE · V1.0

Budget prévisionnel & Plan de projet MOTO Editor

Période couverte : septembre 2026 – juin 2027 (10 mois). Deux scénarios de financement (indépendant « lean » vs startup structurée), plan de travail en 5 workstreams, jalons M1/M2/M3, prévisions de revenus freemium et dispositif de suivi budgétaire.

Septembre 2026
Édition v1.0

Horizon
10 mois · 3 jalons

Scénarios
A (lean) · B (startup)

Devise
Euro (€)

Sommaire

1. Synthèse exécutive & hypothèses	p. 2
2. Plan de projet — WBS & livrables	p. 3
3. Calendrier & ressources	p. 4
4. Budget détaillé — Scénario A (lean)	p. 5
5. Scénario B (startup) & comparaison	p. 6
6. Revenus freemium & seuil de rentabilité	p. 7
7. Suivi budgétaire, risques & conclusion	p. 8

1. Synthèse exécutive & hypothèses

≈ 12 k€ SCÉNARIO A (10 MOIS, HORS RÉMUN.)	≈ 27 k€ SCÉNARIO A INCL. RÉMUN. FONDATEUR	≈ 153 k€ SCÉNARIO B (STARTUP, 12 MOIS)	M+14 SEUIL DE RENTABILITÉ ESTIMÉ (A)
---	---	--	--

Hypothèses de travail

Projet & équipe - Équipe actuelle : 1 développeur fondateur + 3 IA d'assistance (Claude Code, Qwen, Copilot) — productivité estimée ×2 à ×3 sur le code. - Périmètre = feuille de route v1.0 : stabilisation, MotoBridge/XENO, LSP, plateforme, distribution, croissance. - Doctrine : backend d'abord, UI mince, pas d'UI factice, 100+ paramètres.	Marché & modèle - Marché IDE 16,5 Md\$ (2026), CAGR 10,8 % ; 84 % des devs adoptent l'IA. - Modèle : open source + freemium, plan Pro 12 €/mois (hyp. 10–20 \$ validée par Zed/Cursor). - Conversion free→Pro : 2,5 % ; churn mensuel 3 % ; prix constants sur la période. - Provision pour imprévus : 12 % du sous-total de chaque scénario.
---	--

Méthode : coûts unitaires vérifiés sur tarifs publics 2026 (certificats, comptes développeurs, matériel milieu de gamme, audits externalisés). Tous montants HT arrondis.

2. Plan de projet — WBS & livrables

Lot	Workstream / tâches	Durée	Livrable / critère d'acceptation	Charge (j.h)
A	Stabilisation (H1) · A1 Chantier barre de titre (sondes GWL_STYLE, LVT) · A2 Persistence docks + Settings 100+ · A3 Warnings < 50 + tests xUnit	8 sem. (S26–O26)	M1 : zéro défaut visuel bloquant ; disposition persistante ; 100+ paramètres exposés.	40
B	MotoBridge / IA (H2) · B1 Tier 28 : requêtes→XENO, diffs affichés, supervision · B2 LLM embarqué ONNX + décodage spéculatif · B3 Marketplace d'agents	12 sem. (O26–J27)	M2 : flux complet « demande → XENO → diff → appliqué » démontrable.	60
C	Éditeur profond (H2–H3, parallèle) · C1 LSP Roslyn (inlay hints, diagnostics) · C2 PieceTable + Git avancé · C3 Coloration/prévisualisation temps réel	16 sem.	LSP actif sur C# ; undo 1000 niveaux ; coloration incrémentale stable.	55
D	Plateforme & distribution (H3) · D1 Portage macOS/Linux (PlatformEngine) · D2 Installateurs signés + winget + MAJ Ed25519 · D3 i18n FR/EN + accessibilité WCAG	16 sem. (J27–M27)	Builds signés sur ≥ 2 plateformes ; audit accessibilité documenté.	60
E	Croissance (H3+) · E1 CRDT collab + DAP debugger · E2 Lancement : site, contenu, communautés	10 sem. (M27–J27)	M3 : v1.0 publique ; 2 000 téléchargements le 1 ^{er} mois.	35
Σ	Charge totale estimée (scénario A, fondateur + IA)			≈ 250 j.h

Jalons décisionnels (Go / No-Go)


M1 — fin oct. 2026

- Stabilisation validée → ouverture H2.
- Budget consommé ≤ 30 % du scénario.

M2 — janv. 2027

- MotoBridge opérationnel → ouverture H3.
- Revue qualité : couverture tests ≥ 60 % Moto.Core.

3. Calendrier & plan de ressources

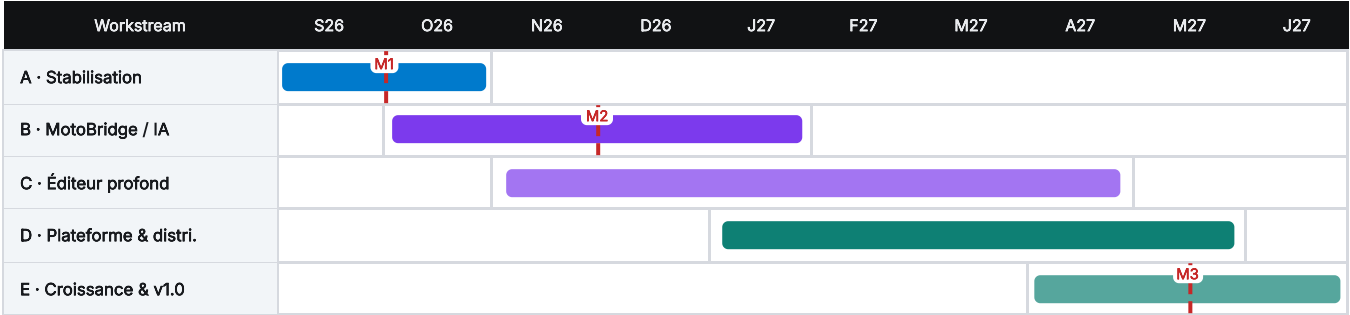

Enchaînement : A → B → D/E ; C en parallèle de B. M3 (juin 2027) = v1.0 publique.

Plan de ressources

Ressource	Scénario A (lean)	Scénario B (startup)	Coût mensuel réf.
Développeur fondateur (+ IA)	100 % — 10 mois	100 % — 12 mois	Rémun. 1 500 € (A)
Développeur senior C#/MAUI	—	100 % dès M2	4 500 €
Designer / QA	—	50 % dès M2	2 000 €
Marketing / communauté	Ponctuel (E2)	50 % dès H3	2 000 €
Prestataires externes	Audits (accessibilité)	Audits + portage macOS/Linux + pentest	Sur devis
Matériel	PC test GPU + MacBook	Idem + parc de test multi-OS	One-shot

Les IA d'assistance (Claude Code, Qwen, Copilot) sont considérées comme un multiplicateur de productivité inclus dans les abonnements outils — aucun coût de développement externalisé sur le cœur (doctrine « fait maison »).

4. Budget détaillé — Scénario A (lean, 10 mois)

4.1 Coûts uniques (investissements)

Poste	Détail	Montant (€)
Certificat de signature EV	Signature SmartScreen pour installateurs Windows	350
Compte Apple Developer	Préparation du portage macOS (D1)	95
Marque (INPI / EUIPO)	Dépôt « MOTO Editor » + logo hexagonal	850
PC de test (GPU)	Validation LLM locaux & modes Turbo/Ultra	1 800
MacBook de test	CI/validation du portage macOS	1 200
Audit accessibilité	Prestation WCAG 2.2 + lecteurs d'écran	1 500
Assets de lancement	Vidéo démo, site one-page, kit presse	1 200
Sous-total investissements		6 995

4.2 Coûts récurrents (sur la période)

Poste	Détail	Montant (€)
Hébergement / CDN	Modèles ONNX, MAJ signées, télémétrie opt-in — 60 €/mois × 10	600
Outils & abonnements	GitHub Pro, domaines, IA assistantes, design — 35 €/mois × 10	350
Publicité ciblée	Reddit / HN / Dev.to — 250 €/mois × 6 (à partir de H3)	1 500
Juridique / comptabilité	Micro-structure, CGU/vie privée, contrats — 120 €/mois × 10	1 200
Sous-total récurrents		3 650

4.3 Total Scénario A

Investissements + récurrents	10 645
Provision imprévus (12 %)	1 300
TOTAL A (hors rémunération fondateur)	≈ 11 950 €
+ Rémunération fondateur (1 500 € × 10)	15 000
TOTAL A complet	≈ 27 000 €

5. Scénario B (startup structurée, 12 mois)

Poste	Détail	Montant (€)
Masse salariale (hors fondateur)	Dev senior 4 500 € + designer/QA 2 000 € + marketing 2 000 € × 12 mois	102 000
Investissements (idem A)	Certificats, marque, matériel, audit accessibilité, assets	6 995
Récurrents renforcés	CDN, outils, juridique, publicité — enveloppe élargie	5 000
Prestation portage macOS/Linux	Contractants PlatformEngine (D1)	12 000
Pentest sécurité	Audit Ed25519 / sandbox / PrivacyScanner avant v1.0	6 000
Salons / événements	Présence dev-tools (stands, talks)	5 000
Provision imprévus (12 %)	—	16 440
TOTAL B		≈ 153 000 €

Comparaison & répartition par catégorie

Catégorie	Scénario A	Scénario B	Répartition B
Ressources humaines	15 000 (fondateur)	102 000	67 %
Investissements	6 995	6 995	5 %
Fonctionnement & marketing	3 650	23 000	15 %
Prestations externes	— (inclus audits A)	23 000	15 %
Imprévus	1 300	16 440	11 %
Total	≈ 27 000	≈ 153 000	100 %

Lecture : le scénario A privilégie la frugalité et valide le produit à moindre risque ; le scénario B achète du temps (time-to-market -3 à -4 mois) et de la robustesse (pentest, portage délégué). Recommandation : démarrer en A, basculer en B si M2 atteint les KPIs (MotoBridge démontrable + 100+ paramètres).

6. Revenus freemium & seuil de rentabilité

6.1 Trajectoire d'adoption (post-lancement M3, juin 2027)

Mois post-lancement	Utilisateurs actifs	Conversion 2,5 %	Abonnés Pro	MRR (12 €)
M+1	2 000	2,5 %	50	600 €
M+3	5 000	2,5 %	125	1 500 €
M+6	12 000	2,5 %	300	3 600 €
M+12	30 000	2,5 % (plafond prudent)	750	9 000 €
M+18	60 000	3 % (marketplace agents)	1 800	21 600 €

6.2 Seuils de rentabilité

Scénario A

- Coût total ≈ 27 k€ ; coûts courants post-lancement ≈ 800 €/mois.
- Break-even mensuel dès MRR ≥ 800 € → atteint vers **M+2/M+3**.
- Remboursement de l'investissement initial vers **M+14**.

Scénario B

- Coût total ≈ 153 k€ ; masse salariale courante ≈ 8,5 k€/mois.
- Break-even mensuel à MRR ≈ 9–10 k€ → atteint vers **M+12/M+14**.
- Retour sur investissement complet vers **M+24 à M+30**.

6.3 Revenus complémentaires (optionnels, an 2)

B2B

- Plan Équipe 50 €/poste/mois (SSO, politiques de réglages, audit logs).
- Support prioritaire & onboarding.

Marketplace

- Commission 20 % sur agents/plugins payants.
- Thèmes & packs de paramètres premium.

Sensibilité : si la conversion tombe à 1,5 %, le break-even du scénario A glisse à M+5 et celui du scénario B au-delà de M+20 → le scénario B exige alors une levée de fonds ou un ralentissement des recrutements.

7. Suivi budgétaire, risques & conclusion

7.1 Dispositif de suivi

- **Revue mensuelle** : réalisé vs prévisionnel par catégorie ; seuil d'alerte à $\pm 10\%$ d'écart cumulé.
- **Revue de jalon** (M1/M2/M3) : Go/No-Go budgétaire — aucun horizon ne démarre si le précédent dépasse son enveloppe de $> 15\%$.
- **Trésorerie** : provision imprévus (12%) intouchable sans décision explicite ; paiements prestataires à 30% / 70% à recette.
- **Outils** : suivi dans settings.json-like local (doctrine data-driven) + rapport mensuel généré par ChangelogAgent.

7.2 Risques budgétaires & parades

Risque	Niveau	Parade budgétaire
Dérapage du chantier barre de titre / stack MAUI	Élevé	Plafond de 3 semaines (A1) ; au-delà, gel et repli sur solution de contournement.
Conversion freemium < hypothèse (1,5 % vs 2,5 %)	Moyen	Activation progressive des revenus B2B/marketplace ; gel des dépenses marketing non mesurables.
Coût matériel GPU (volatilité)	Moyen	Achat d'occasion certifié ; mutualisation avec la machine de dev existante.
Dépendance au fondateur (scénario A)	Élevé	Documentation continue (QWEN.md/CLAUDE.md) ; bascule en B conditionnée aux KPIs.

Conclusion

Le projet est finançable en mode **lean** ($\approx 12\text{--}27\text{ k€}$) grâce à l'effet de levier des IA d'assistance et à la doctrine « fait maison » qui supprime les coûts de licences et de dépendances externes. Le scénario **startup** ($\approx 153\text{ k€}$) se justifie uniquement après validation de M2, pour accélérer le portage multiplateforme et sécuriser la v1.0 (pentest, audits). Dans les deux cas, le modèle freemium à 12 €/mois offre un seuil de rentabilité atteignable en < 18 mois, cohérent avec l'objectif de $5\text{--}10\%$ de part de marché à 5 ans.

Prochaine étape : validation du scénario par le porteur de projet, puis ouverture du chantier A1 (barre de titre) avec enveloppe temps bornée à 3 semaines.
