



DOCUMENT STRATÉGIQUE · V1.0

Feuille de route MOTO Editor 2026 – 2027

Plan d'exécution en trois horizons : stabilisation, orchestration IA
(MotoBridge / XENO-SSS ∞), puis plateforme & croissance. Doctrine : façade
minimaliste, complexité backend, 100+ paramètres.

Septembre 2026
Édition v1.0

Horizons
H1 · H2 · H3 (10 mois)

Stack
.NET · MAUI · WinUI 3

Cible
v1.0 publique

Sommaire

1. Vision, doctrine & état des lieux	p. 2
2. Horizon 1 — Stabilisation & finitions (sept.–oct. 2026)	p. 3
3. Horizon 2 — Orchestration IA & éditeur profond (oct. 2026 – janv. 2027)	p. 4
4. Horizon 3 — Plateforme, distribution & croissance (janv. – juin 2027)	p. 5
5. Calendrier Gantt & jalons	p. 6
6. Priorisation (matrice impact/effort)	p. 7
7. Risques, KPIs & gouvernance	p. 8

1. Vision, doctrine & état des lieux

Vision : reproduire les capacités de **Zed** (3 docks, terminal, IA intégrée, collab) en 100 % fait maison, avec une interface **minimaliste type Claude Code / ChatGPT** et une complexité portée par le backend et **100+ paramètres** data-driven.

Doctrine : backend d'abord, UI mince · pas d'UI factice · MOTO Editor édite/affiche, MOTO AI assiste/route, XENO-SSS∞ structure · délégation comme « Zed → Claude Code ».

0

ERREUR BUILD (3 PROJETS)

3

DOCKS MODULAIRES LIVRÉS

20

AGENTS IA SPÉCIALISÉS

~300

PARAMÈTRES CATALOGUE

✓

Déjà livré

- Réhabilitation complète (Snake2000.Engine, Moto.Core, Moto.Editor)
- Accueil style Claude Code + overlays menus
- Panneaux Zed : resize, changement de côté, DnD inter-docks
- Dock du bas + terminal interactif réel (Ctrl+`)
- Settings : 15 catégories · GitHub OAuth · palette Ctrl+Shift+P
- Sécurité : Ed25519, sandbox, AtomicUpdater · MSIX + raccourci

🕒

À traiter (acquis du journal de bord)

- Barre de titre bleue Windows (chantier dédié, sondes prêtes)
- MotoBridge / OrchestratorAgent (Tier 28)
- Persistance de disposition des docks
- v1.0 : LSP Roslyn · CRDT réel · DAP · tests · i18n · accessibilité

Feuille de route 2026-2027 · Septembre 2026

2 / 8

2. Horizon 1 — Stabilisation & finitions

SEPT. – OCT. 2026

Objectif : **zéro défaut visible** et base saine avant tout nouveau chantier. Chaque lot passe par revue croisée + rebuild Debug/Release avant commit.

A1 · Chantier barre de titre bleue (session dédiée)

PRIORITÉ 1

- Sondes : lecture GWL_STYLE (bits WS_CAPTION), Live Visual Tree, teinte de rangée
- Interdit : retenter SetBorderAndTitleBar (3 échecs, fenêtre invisible)
- Interdit : migration MAUI/.NET (échec .NET 10 du 30/08, WASDK 1.8 épinglé)
- Livable : une seule titlebar, drag custom, boutons -/□/×, packagé + non-packagé

A2 · Persistance & réglages

- Persistance de disposition : docks (hauteur, visibilité, côté des panneaux)
- Settings 100+ exposés : terminal.*, docks.*, ghost text, décodage spéculatif
- Templates de réglages + recherche (déjà partiel) consolidés

A3 · Qualité & dette

- Warnings ~300 → objectif < 50 (CS8618/CS8625/CS0618 prioritisés)
- Squelettes de tests xUnit via agent.tests.micro sur Moto.Core
- Nettoyage code mort (Moto.UI/ non raccordé, doublons CustomMenuBarView)
- Crash-log + breadcrumbs conservés (observabilité titlebar)

Jalon M1 (fin oct. 2026)

Application **sans défaut visuel bloquant**, disposition persistante, 100+ paramètres exposés, build < 50 warnings. → Go/No-Go Horizon 2.



3. Horizon 2 — Orchestration IA & éditeur profond

OCT. 2026 – JANV. 2027

B1 · MotoBridge — Tier 28 (cœur de l'horizon)

PRIORITÉ 1

- Requêtes gen/fix envoyées à XENO-SSS∞ depuis l'éditeur
- Réception diffs / logs / patchs dans MOTO Editor
- Affichage visuel des diffs + validations dans l'interface
- Supervision temps réel (pipeline Scanner→Analyzer→Synthesizer→Connector→Validator)
- Branchement OrchestratorAgent + garde de confirmation utilisateur

B2 · IA locale renforcée

- Ollama + modèle embarqué ONNX (qwen2.5-0.5b) · décodage spéculatif
- Marketplace d'agents installables (cadre SpecializedAgentRegistry prêt)
- Cortex/Neural : suggestions proactives branchées sur historique réel
- Explainability logs activés par défaut (audit)

C1 · Éditeur profond

- LSP Roslyn : inlay hints, diagnostics, complétion typée (point v1.0)
- PieceTableBuffer (Tier 30) branché sur l'éditeur + undo 1000 niveaux
- Prévisualisation / coloration temps réel (inspiré Tree-sitter de Zed, adapté WebView)
- Git avancé : branches visuelles, diff inline via GitService (CLI git)

Jalon M2 (janv. 2027)

MotoBridge opérationnel : un flux complet « demande → XENO → diff affiché → appliqué » démontrable en conditions réelles ; LSP Roslyn actif sur C#. → Go/No-Go Horizon 3.

4. Horizon 3 — Plateforme, distribution & croissance

JANV. – JUIN 2027

D1 · Sortir de Windows

- PlatformEngine : portage macOS/Linux (générateurs Avalonia + CI)
- Validation incrémentale par plateforme ; feature-parity progressive
- Accessibilité complète (UI Automation / WCAG) documentée et testée
- i18n FR/EN (LanguagePack extensible)

D2 · Distribution & modèle économique

- Installateur per-user single-file (sans UAC) + MSIX + winget
- Mises à jour signées Ed25519 (AtomicUpdater) en canal stable/bêta
- Open source (licence à trancher : MIT vs GPL) + freemium Pro 10–20 \$/mois
- GitHub Releases automatisées + notes de version via ChangelogAgent


E1 · Croissance & communauté

- Collab temps réel : CRDT réel + présence (CollabSession/PatchEngine)
- DAP debugger (point v1.0) dans le dock du bas
- Marketing ciblé : r/vscode, Hacker News, Dev.to, créateurs outils dev
- Onboarding : PedagogyEngine, Story Mode, missions guidées

Jalon M3 (juin 2027)


v1.0 publique : Windows + au moins une plateforme secondaire, CRDT collab, DAP, i18n, accessibilité, modèle freemium lancé. Objectif marché : trajectoire 5–10 % à 5 ans.

5. Calendrier Gantt & jalons

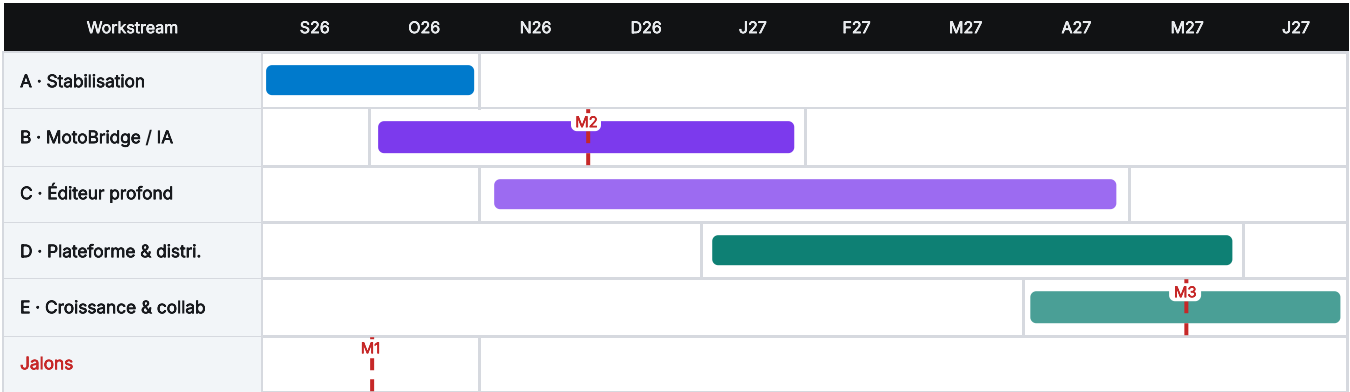

M1 fin oct. 2026 (stabilisation) · M2 janv. 2027 (MotoBridge opérationnel) · M3 juin 2027 (v1.0 publique). Les barres translucides sont des chantiers parallèles.

6. Priorisation — matrice impact / effort

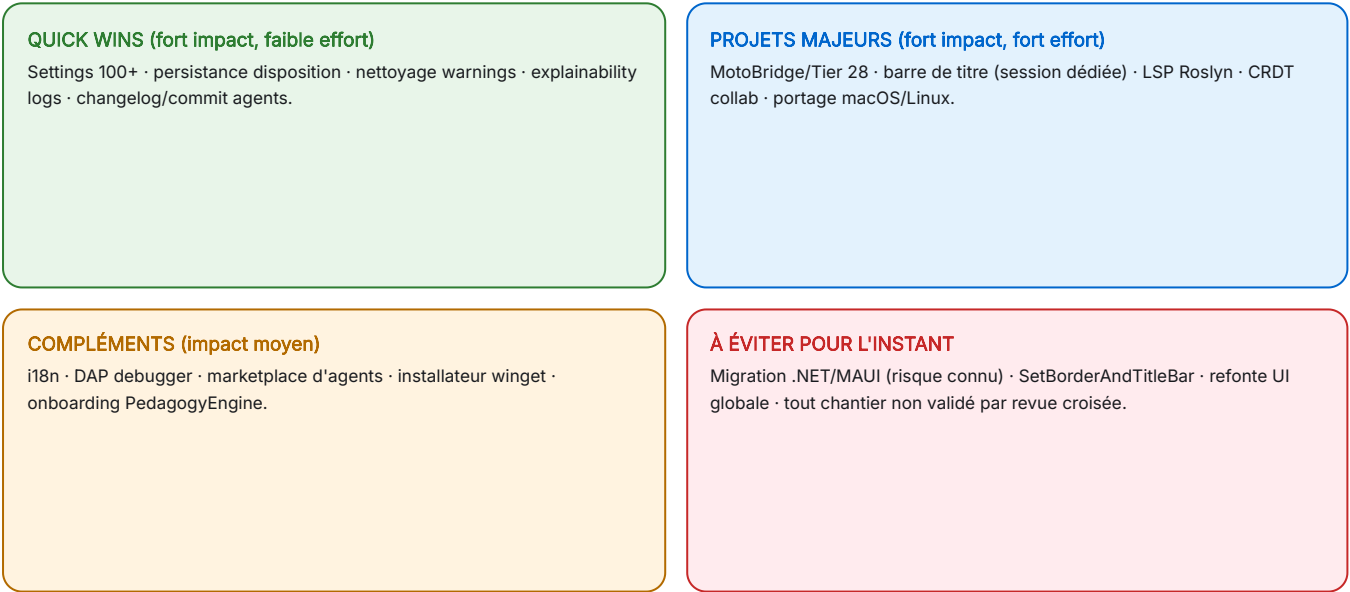

7. Risques, KPIs & gouvernance

Risque	Niveau	Parade
Instabilité stack MAUI/WinUI 3 (titlebar, régressions)	Élevé	WASDK 1.8 épinglé ; chantiers isolés ; sondes avant correctif ; jamais de migration sous pression.
Équipe unique / concentration du savoir	Élevé	QWEN.md / CLAUDE.md à jour ; docs auto (DocEngine) ; open source pour attirer contributeurs.
Domination VS Code / entrants financés	Moyen	Stratégie de niche (privacy, accessibilité, légèreté) ; pas d'attaque frontale.
Périmètre qui dérive (100+ idées en backlog)	Moyen	Doctrine « backend d'abord, UI mince » ; Go/No-Go à chaque jalon ; Idées à implémenter.txt hors scope courant.
Adoption entreprise lente	Faible	Cibler d'abord indépendants & petites équipes ; freemium ; accessibilité comme argument B2B.

KPIs de suivi (revue à chaque jalon)

< 1 s DÉMARRAGE À FROID	< 300 Mo EMPREINTE MÉMOIRE	100+ PARAMÈTRES EXPOSÉS	≥ 60 % COUVERTURE TESTS MOTO.CORE
1 FLUX XENO DÉMONSTRABLE (M2)	2+ PLATEFORMES À M3	0 UI FACTICE LIVRÉE	5-10 % PART DE MARCHÉ À 5 ANS

Gouvernance & règles d'or

Processus - Revue croisée systématique avant commit (chantiers structurels) - Code complet, additif, compilable ; méthodes < 40 lignes ; XML docs 1 ligne = 1 paramètre (SettingsCatalog) ; MotoTheme.xaml via DynamicResource - Namespaces Microsoft.UI.Xaml pour le natif Windows ; #if WINDOWS	Frontières d'architecture - MOTO Editor : édite/affiche/ouvre/sauvegarde/commandes - MOTO AI : assiste/prédit/route · XENO-SSS∞ : opérations structurées - Interdits : parsing profond, architecture projet, validation namespaces, invention de systèmes - Sécurité : jamais de clé/PAT en clair ; signatures Ed25519 ; sandbox LLM
---	---

Conclusion

Cette feuille de route traduit la doctrine en plan d'exécution : **stabiliser d'abord** (Horizon 1), **brancher le cerveau** (Horizon 2 : MotoBridge/XENO), puis **ouvrir la plateforme** (Horizon 3). Elle assume deux renoncements tactiques — pas de migration .NET/MAUI sous pression, pas d'attaque frontale de VS Code — au profit d'une stratégie de niche : **IDE minimaliste, puissant & accessible**.

Le rythme est volontairement jalonné (M1/M2/M3) avec Go/No-Go : chaque horizon ne démarre que si le précédent est démontré stable. C'est la condition pour qu'une équipe unique livre un produit vendable sans sacrifier la qualité.

1 Sept. – oct. 2026

Barre de titre en chantier dédié, persistance, 100+ paramètres, dette < 50 warnings.

2 Oct. 2026 – janv. 2027

MotoBridge (Tier 28) opérationnel, IA locale renforcée, LSP Roslyn, PieceTable branché.

3 Janv. – juin 2027

Portage macOS/Linux, installateurs signés, CRDT + DAP, i18n, accessibilité, freemium → v1.0 publique.

Prochaine action immédiate : lancer l'Horizon 1 (A1 barre de titre avec sondes GWL_STYLE + Live Visual Tree). Document maintenu à jour à chaque jalon.
